


外構、竣工状況

- ・ 竣工した外構工事には、札幌市緑化推進条例に基づいて施工されるはずの犬走り・緑地が未施工となって、未施工部分がアスファルト舗装されている。
- ・ 給湯方式の変更により、給排水埋設配管工事が取り止めとなっている。
- ・ ロードヒーティング設備工事のための汚水・雨水桝配管経路変更工事が行われ、水道メータ設置位置が変更となっている。
- ・ ロードヒーティングパイピングによりアスファルト舗床が t 50 から t 50～ t 30 に変更されるアスファルト舗装工事が行われている。
- ・ 集水舛配管工事が取り止めとなり、南側駐車スペースに浸透桝が 2 カ所に設置されている。

汚水桝配管・雨水桝配管・集水舛配管・給水配管・水道メータ

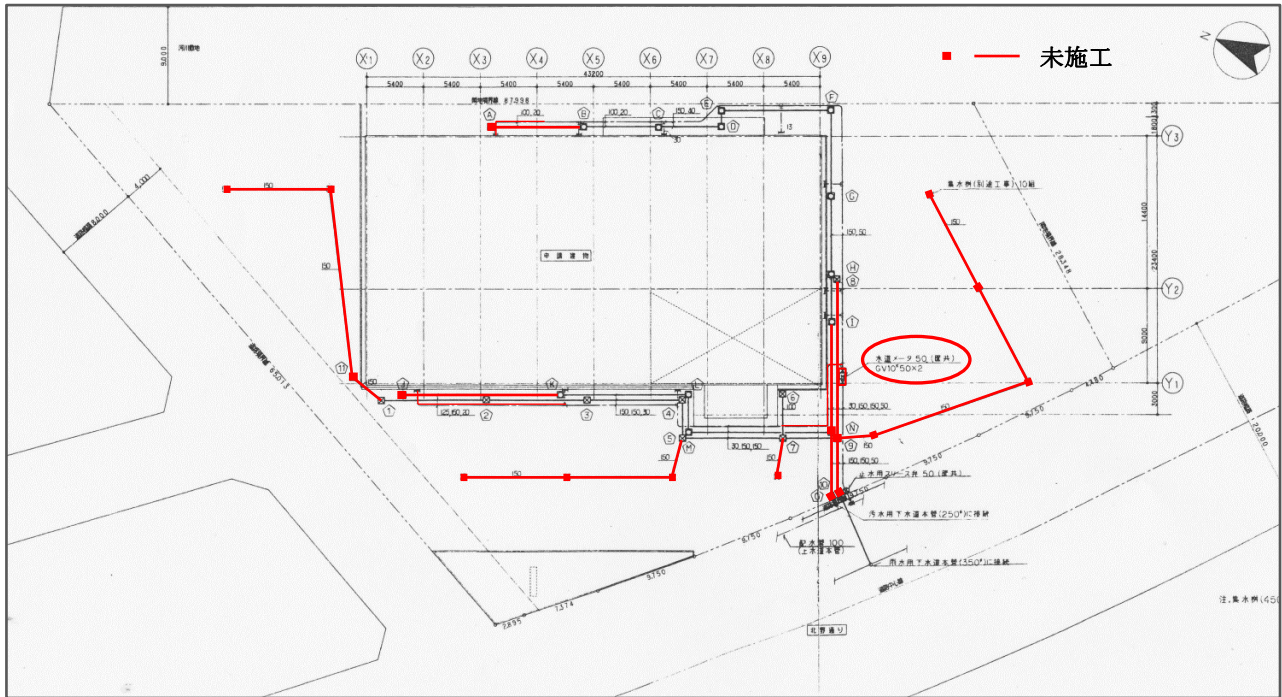

犬走り・緑地・集水弁・PC縁石



- 犬走り・緑地
- 集水弁
- PC縁石 200×240×L600
